

新設小学校建設事業の現状報告について

福津市教育委員会教育部
新設小学校準備室

新設小学校建設事業の現状報告について


目次

1. 新設小学校敷地配置と開校までのスケジュール
2. 新設小学校 整備概要
3. 新設小学校 造成概要（工事区分）
4. 新設小学校建設事業の現状【工事工程】
5. 新設小学校建設事業の現状【造成工事】
6. 新設小学校建設事業の現状【建築工事】

1. 新設小学校敷地配置と開校までのスケジュール

【令和7年12月18日全員協議会資料】

敷地配置（土地利用）計画図

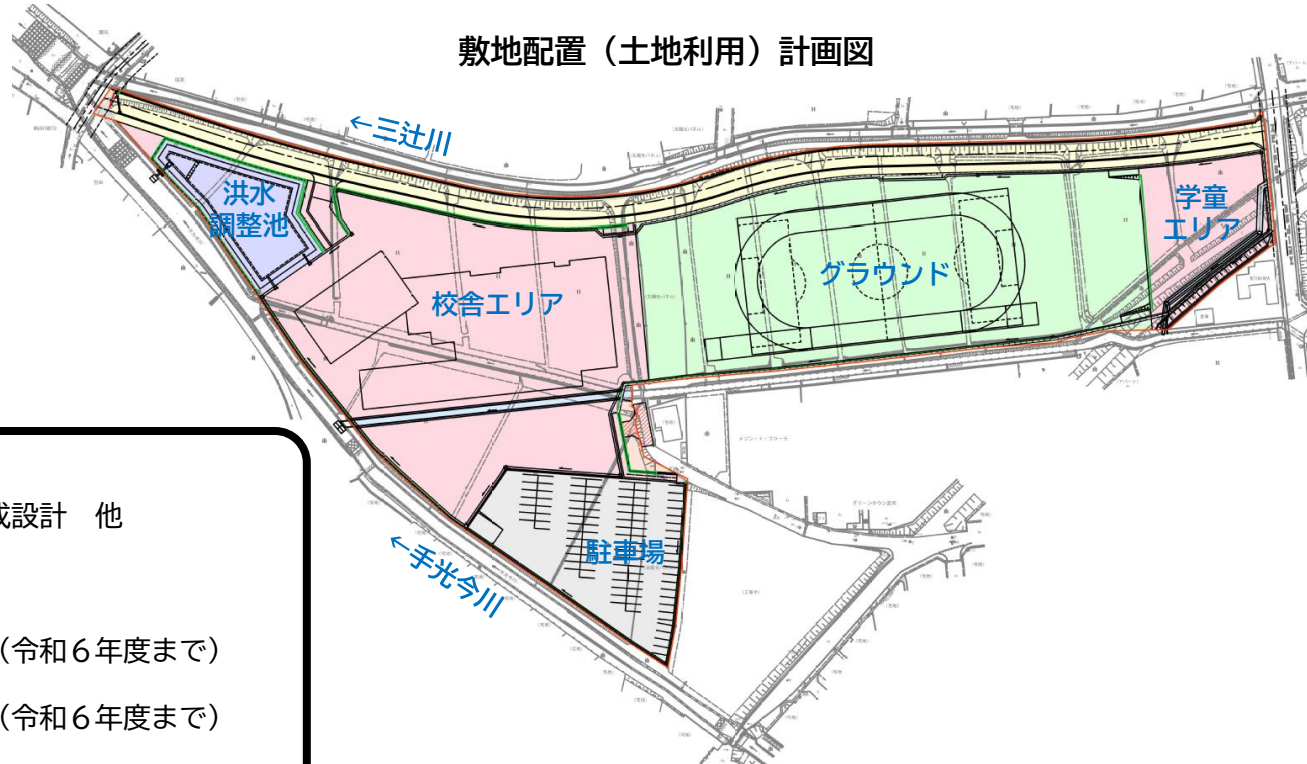


令和4年度
用地測量・造成設計 他

令和5年度
用地取得
物件移転補償（令和6年度まで）
建築基本設計
周辺影響調査（令和6年度まで）

令和6年度
造成工事（1・2工区）
造成修正設計
建築実施設計


令和7年度
造成工事（1・2・3工区）
校舎建築工事
開校準備（校名・校章・通学路等）

令和8年度
造成工事（3工区）
校舎建築工事
開校準備（校歌・通学案内等）
学校運営備品等の搬入

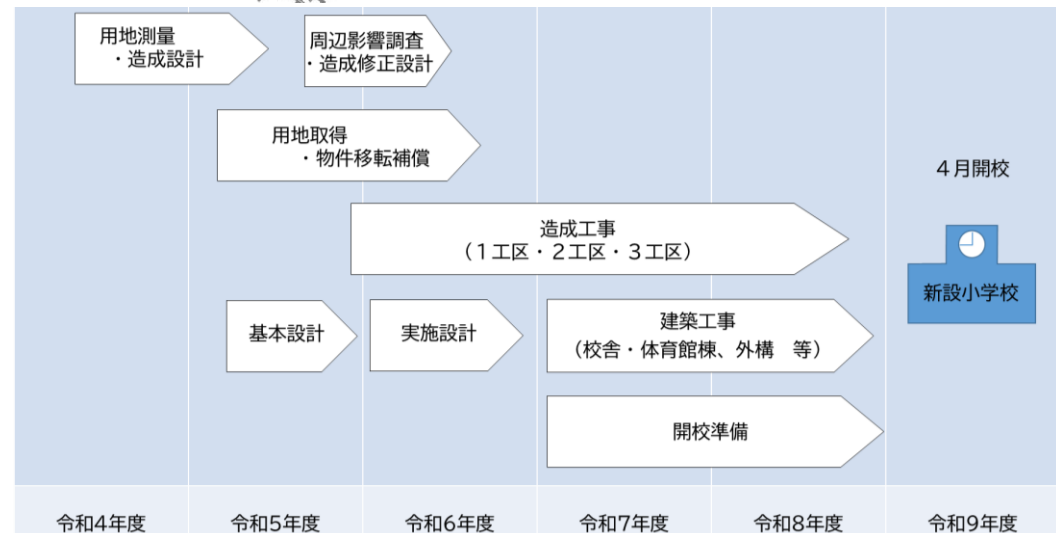


2. 新設小学校 整備概要

【令和7年12月18日全員協議会資料】

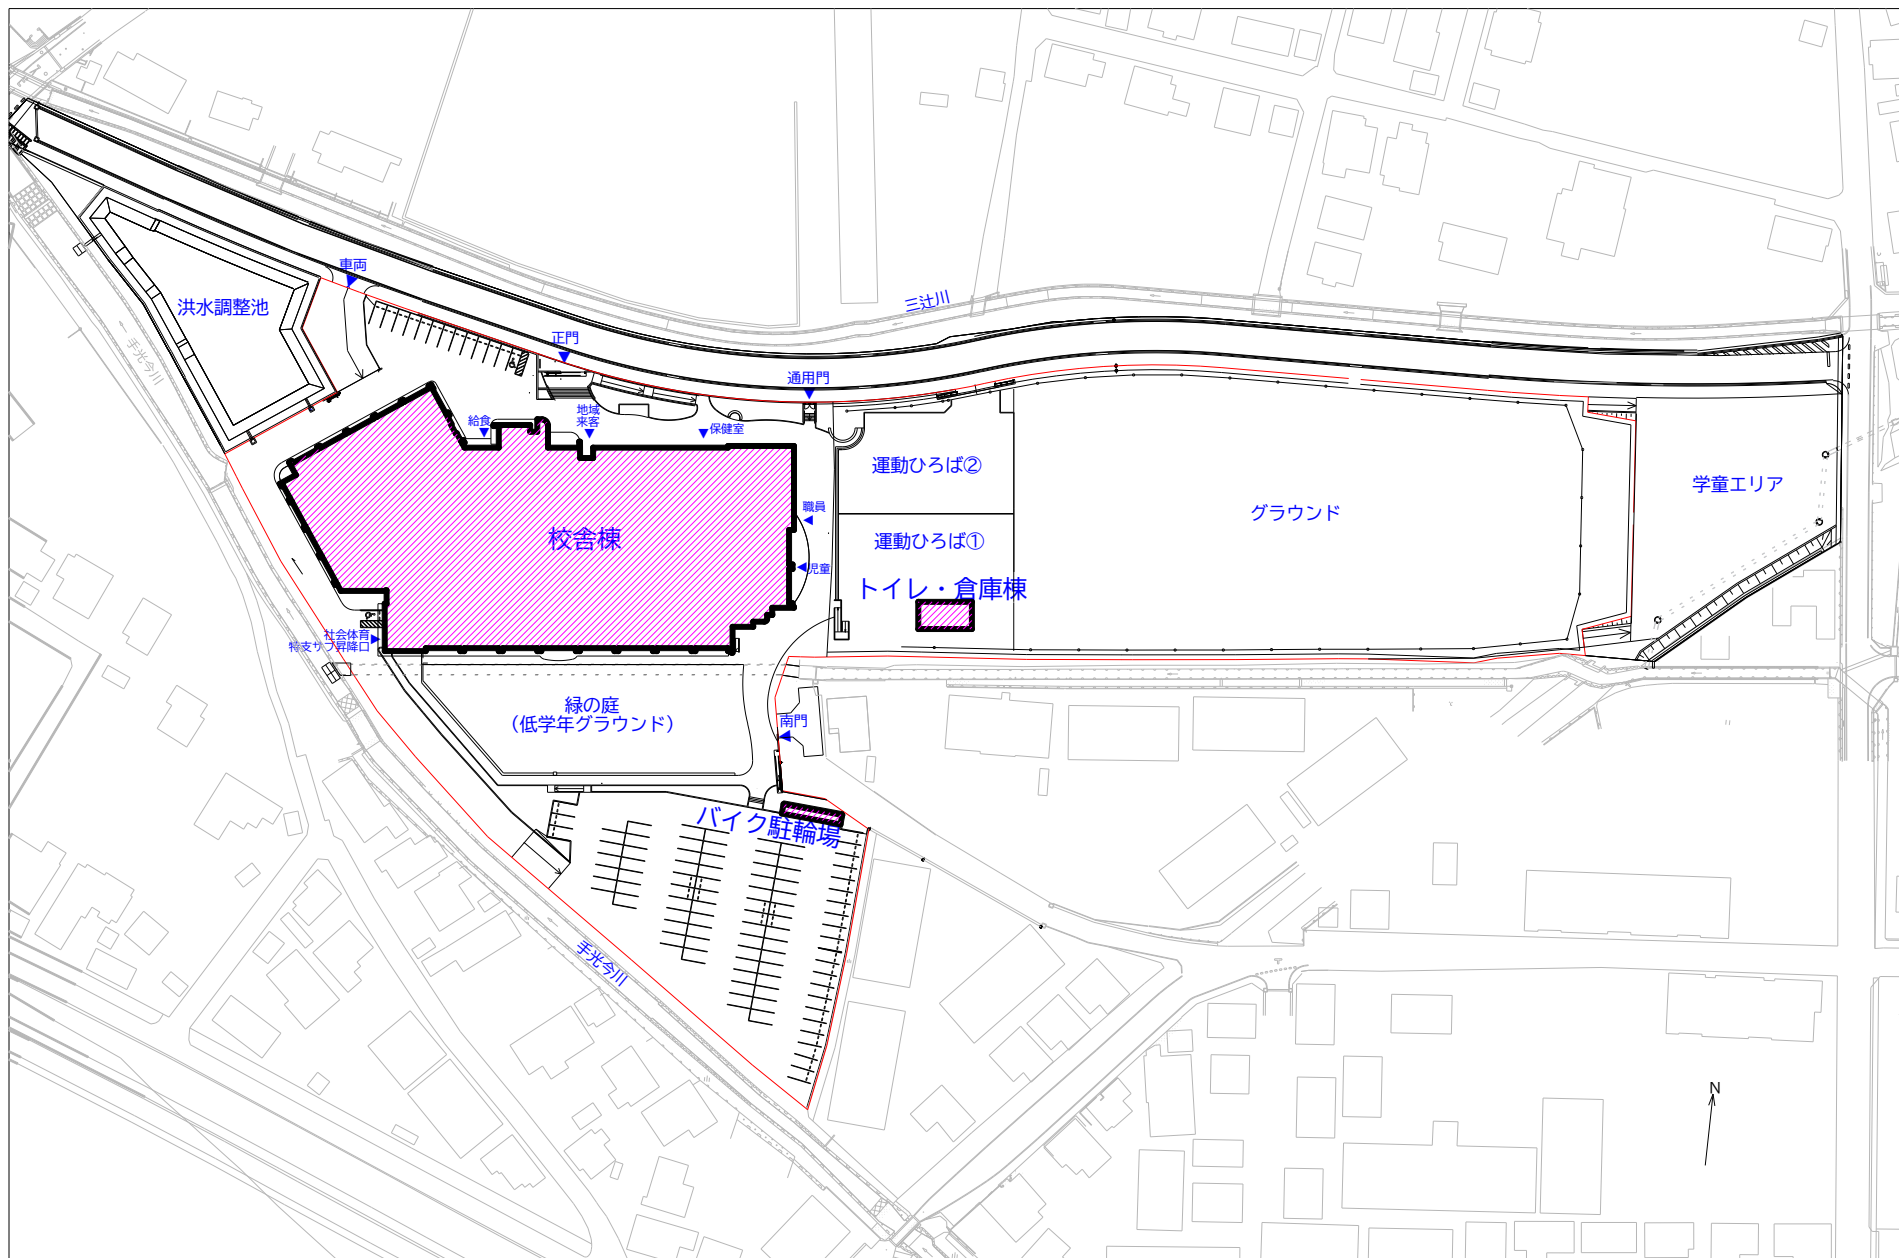

3. 新設小学校 造成概要（工事区分）


【令和7年12月18日全員協議会資料】

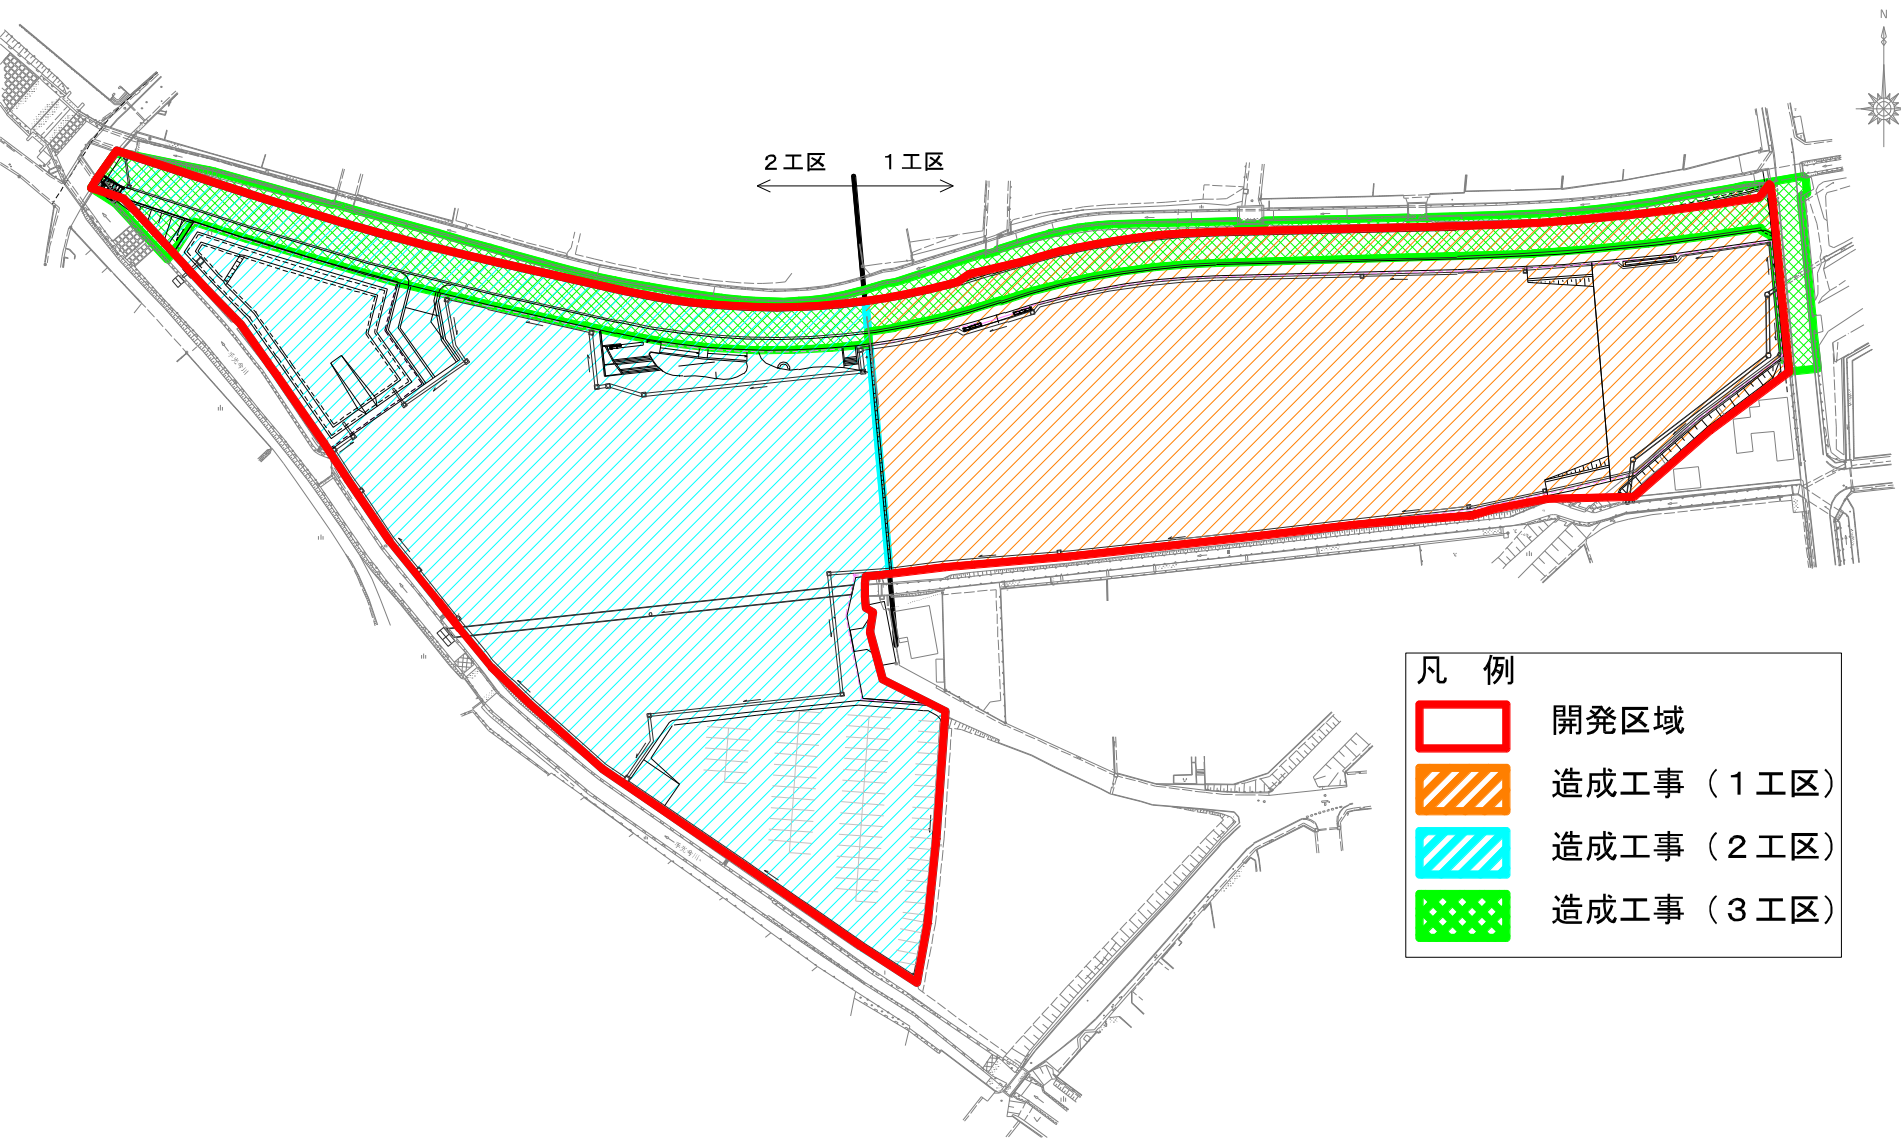

凡 例	
	開発区域
	造成工事（1工区）
	造成工事（2工区）
	造成工事（3工区）

4. 新設小学校建設事業の現状【工事工程】

【令和7年12月18日全員協議会資料】


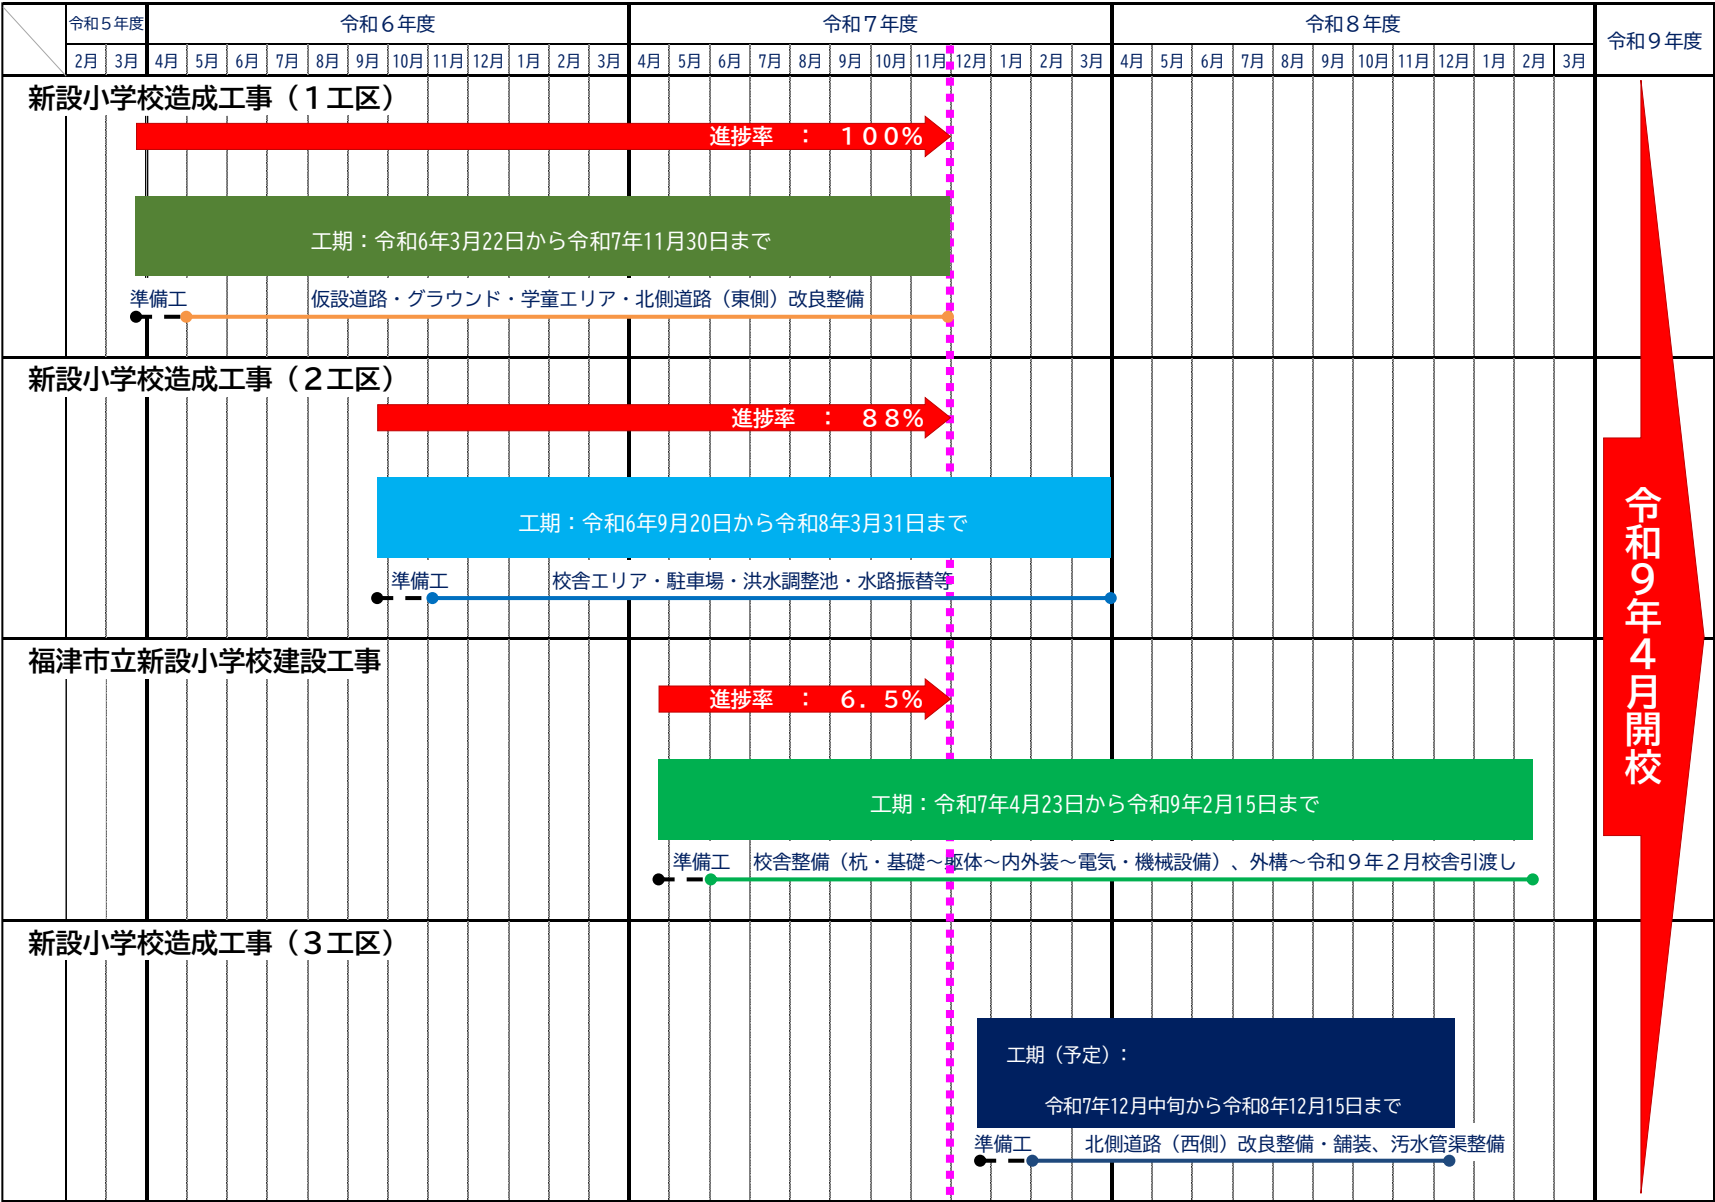


令和9年4月開校

各工事受注者の創意工夫により、令和7年11月末現在において予定どおりに進捗しています。

5. 新設小学校建設事業の現状【造成工事】

【令和7年12月18日全員協議会資料】

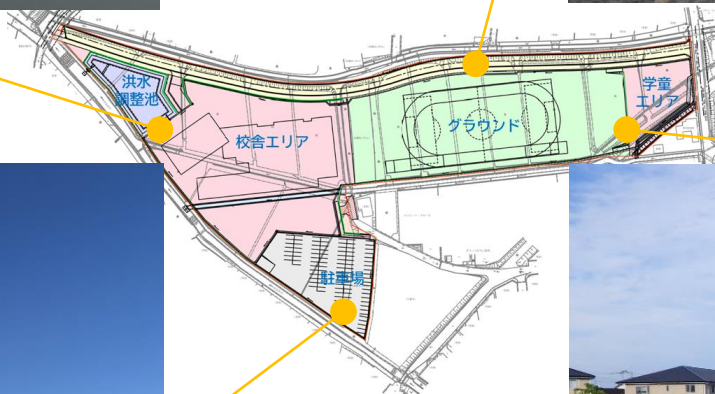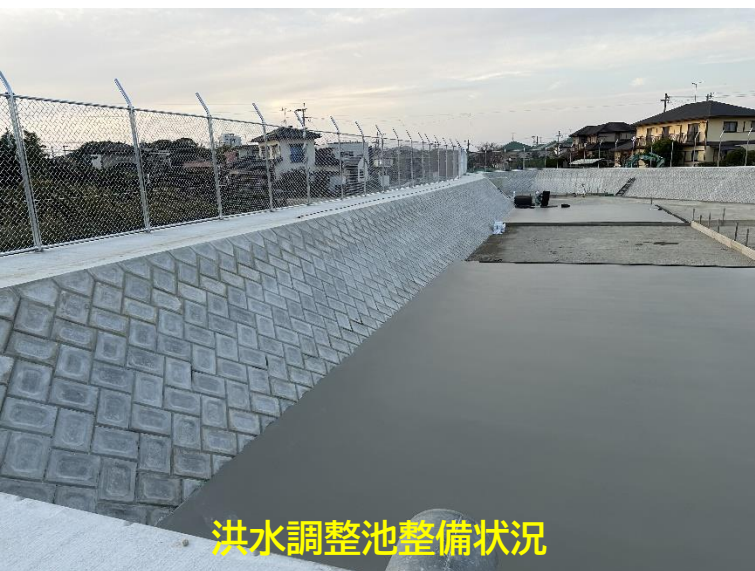

6. 新設小学校建設事業の現状【建築工事】

【令和7年12月18日全員協議会資料】



6. 新設小学校建設事業の現状【建築工事】

【令和7年12月18日全員協議会資料】

3階	普通教室、ラーニングスペース、多目的室、理科室1、理科室2兼多目的室、音楽室、図工室 等
2階	普通教室、ラーニングスペース、特別支援教室、多目的室、外国語教室兼多目的室、図書室・閲覧室 等
1階	普通教室、ラーニングスペース、特別支援教室、多目的室、昇降口、玄関、校長室兼応接室、事務室、職員室、保健室、家庭科室、PTA会議室、屋内運動場（体育館） 等
基礎	
杭	

※構造体の工事中

※完了



建築工事の令和7年11月末現在の状況

- ①予定どおりに進捗しています。 ②杭工事を完了し、基礎構造体の工事を進めています。
